REPORTE MENSUAL · PLANTA SOLAR 5.2 KWP · APODACA, N.L.

Octubre 2026

2 × Hoymiles HMS-2250 · 8 × Jinko 650 W
Generado el 05/11/2026 11:06
Monitor Solar Local (sin nube)

PRODUCCIÓN
163.1 kWh
15 días con producción

CONTRA LA COTIZACIÓN
-54 %
prometido 358 kWh en 18 días (616 en el mes completo); 18 días con los inversores apagados a propósito

AHORRO
$406 MXN
tarifa 1C por escalones

PROMEDIO DIARIO
5.3 kWh
1.01 kWh/kWp


MEJOR DÍA
26.8 kWh
22/10

RENDIMIENTO (PR)
— %
energía / (5.2 kWp × insolación)

SIN RED (CON SOL)
0.0 h
0 cortes · 0.0 kWh perdidos

COBERTURA DEL MONITOR
24.4 %
72.6 % de minutos perdidos

Producción por día

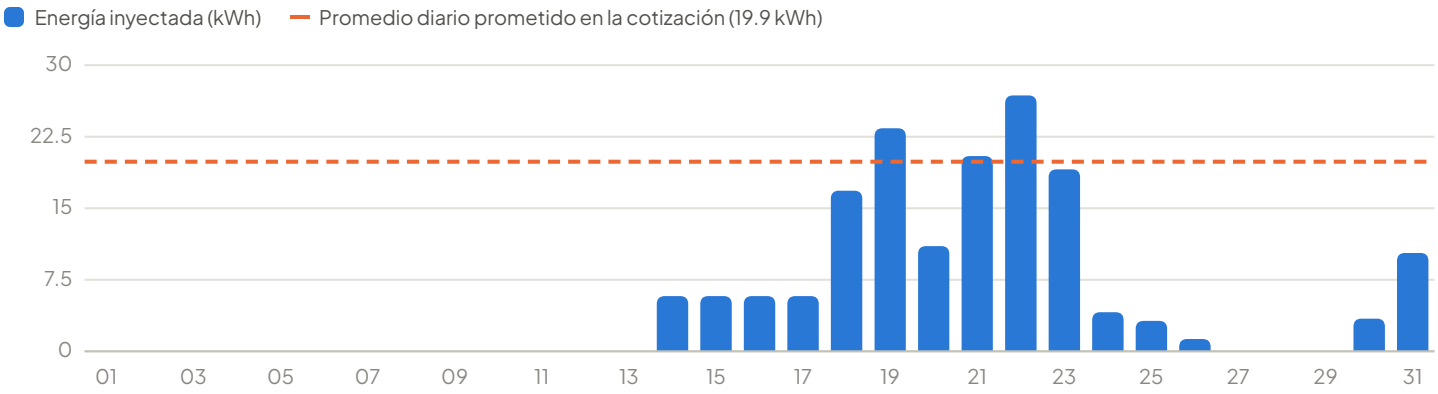


Hallazgos del mes

! AVISO 29/10/2026: ningún minuto registrado. El monitor estuvo apagado todo el día (PC apagada) o los DTU no respondieron. La energía del día está completa (sale del contador del inversor); se pierde el detalle por minuto y por panel. · Cobertura del monitor

! AVISO 30/10/2026: faltan 222 minutos (3.7 h), sobre todo la mañana (empieza a las 09:51) y la tarde (termina a las 16:47). Lo más probable es que la PC o el monitor estuvieran apagados. La energía del día está completa (sale del contador del inversor); se pierde el detalle por minuto y por panel. · Cobertura del monitor

! AVISO 31/10/2026: faltan 248 minutos (4.1 h), sobre todo la mañana (empieza a las 11:50). Lo más probable es que la PC o el monitor estuvieran apagados. La energía del día está completa (sale del contador del inversor); se pierde el detalle por minuto y por panel. · Cobertura del monitor

Energía por panel

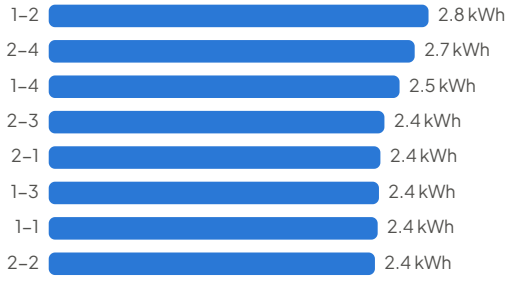

Cortes de red

Sin cortes de red.

Alarmas

INICIO	INV.	ALARMA
25/10/2026 06:46	1	Sobrefrecuencia de la red
25/10/2026 06:43	1	Alarma 223 (no documentada por Hoymiles)
25/10/2026 06:43	1	Desconexión de la red
25/10/2026 06:43	2	Alarma 223 (no documentada por Hoymiles)
25/10/2026 06:43	2	Desconexión de la red

Recibo de CFE (bimestre)

BIMESTRE	CONSUMO BASE KWH	SOLAR KWH	BOLSA KWH	SIN PANELES	CON PANELES	AHORRO
16 Sep–15 Nov 26	843	237	—	$1,601.08	$1,011.59	$589.49

Producción: energía inyectada a la red según los contadores de los microinversores. Ahorro: tarifa 1C por escalones, con IVA; cada kWh solar se descuenta del escalón más caro del bimestre (consumo base del historial del recibo). Cotización A2976b de Neo Simple Solar S.A. de C.V. (7258 kWh/año estimados con datos de la NASA). Radiación: Open-Meteo (modelo meteorológico).
