REPORTE MENSUAL · PLANTA SOLAR 5.2 KWP · APODACA, N.L.

Noviembre 2026 (al 05/11)

2 × Hoymiles HMS-2250 · 8 × Jinko 650 W
Generado el 05/11/2026 11:00
Monitor Solar Local (sin nube)

PRODUCCIÓN
73.4 kWh
5 días con producción · mes en curso

CONTRA LA COTIZACIÓN
-17 %
prometido 88 kWh en 5 días (529 en el mes completo); 2 días con los inversores apagados a propósito

AHORRO
$183 MXN
tarifa 1C por escalones

PROMEDIO DIARIO
14.7 kWh
2.82 kWh/kWp


MEJOR DÍA
24.1 kWh
04/11

RENDIMIENTO (PR)
71 %
energía / (5.2 kWp × insolación)

SIN RED (CON SOL)
0.0 h
1 cortes · 0.0 kWh perdidos

COBERTURA DEL MONITOR
64.9 %
34.8 % de minutos perdidos

Producción por día

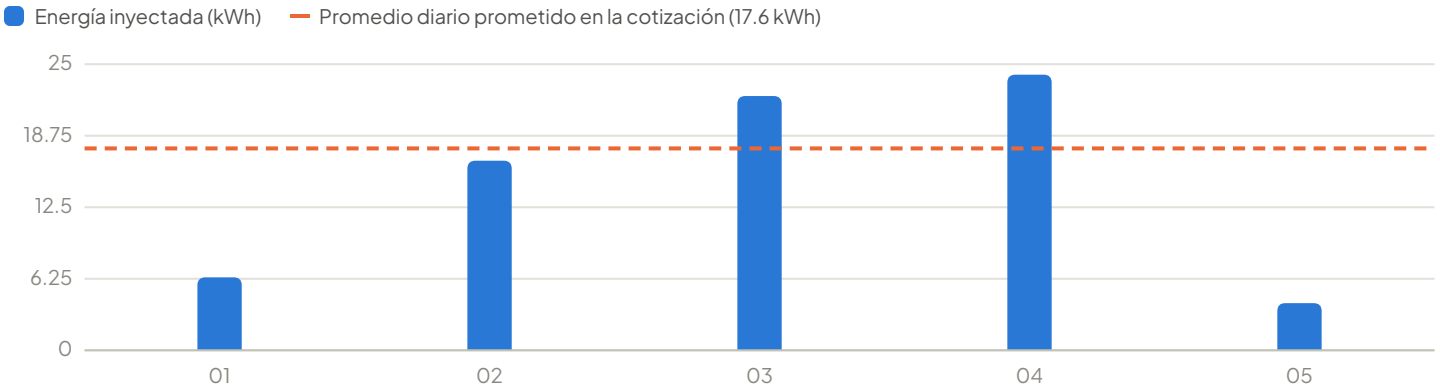

Hallazgos del mes

! AVISO 01/11/2026: ningún minuto registrado. El monitor estuvo apagado todo el día (PC apagada) o los DTU no respondieron. La energía del día está completa (sale del contador del inversor); se pierde el detalle por minuto y por panel. · Cobertura del monitor

Energía por panel



Cortes de red

INICIO	FIN	DURACIÓN	ENERGÍA PERDIDA
04/11/2026 06:36	06:37	1 min	0.00 kWh

Alarmas

Sin alarmas.

Recibo de CFE (bimestre)

BIMESTRE	CONSUMO BASE KWH	SOLAR KWH	BOLSA KWH	SIN PANELES	CON PANELES	AHORRO
16 Sep–15 Nov 26	843	236	—	$1,601.08	$1,012.40	$588.68

Producción: energía inyectada a la red según los contadores de los microinversores. Ahorro: tarifa 1C por escalones, con IVA; cada kWh solar se descuenta del escalón más caro del bimestre (consumo base del historial del recibo). Cotización A2976b de Neo Simple Solar S.A. de C.V. (7258 kWh/año estimados con datos de la NASA). Radiación: Open-Meteo (modelo meteorológico).
